

# Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

## Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:  
GVKo-0551/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters -  
Beauftragung Nachtrag. Nr. 6- Poller für Anlegedalben zum Vorhaben: Neubau  
Seebrücke Koserow

Amt / Bearbeiter  
FD Bau / Hering

Datum:  
08.02.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

### Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung Nachtrag Nr. 6 – Poller für Anlegedalben zum Vorhaben: Neubau Seebrücke Koserow in Höhe von 18.342,30 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

### Sachverhalt:

Die Begründung für den Poller für den Anlegedalben sind der anliegenden Nachtragsbegründung zu entnehmen.  
Das Nachtragsangebot beläuft sich auf 18.342,30 € brutto.

### Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für den Nachtrag werden durch den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Koserow abgedeckt.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Koserow	13						

**PRÜFUNG NACHTRAGSANGEBOT**

**Bauherr :**  
Gemeinde Koserow  
-Kurbetrieb-  
Hauptstraße 31  
17459 Koserow

<b>Bauvorhaben:</b>	Seebrücke Koserow
<b>Objekt:</b>	Seebrücke Koserow
<b>Gewerk / Baulos:</b>	Rammung, Stahl-/Holzbau
<b>Firma:</b>	Heuvelman Ibis GmbH Hafenstraße 10a 26789 Leer

**Nachtragsangebot Nr. 6 vom 19.11.2020**

über  
Anlegedalben Poller

Sehr geehrter Bauherr,

o. g. Nachtragsangebot haben wir geprüft und übergeben es Ihnen hiermit zur weiteren Bearbeitung mit den nachfolgenden Prüfvermerken und Bestätigungsempfehlungen :

**1. Veranlasser :**

Bauherr  JA  NEIN      Auftragnehmer  JA  NEIN      Sonstiges  JA  NEIN

**2. Anspruchsgrundlagen :**

- Die Leistung ist vom AN im Rahmen der Bauberatungen vor der Ausführung angekündigt worden.
- Die Leistung wurde ohne Auftrag begonnen und mit beiliegendem Nachtragsangebot angezeigt.
- Die Leistung wurde aus folgenden Grund bereits ausgeführt:

**Begründung**

- zusätzliche Leistung (VOB/B, § 2, Nr. 6)
- Änderung Bauentwurf (VOB/B, § 2, Nr. 5)
- Mengenmehrung
- Sonstige

Erläuterungen :

Für das feste Vertäuen der Ausflugsschiffe an der Seebrücke Koserow waren je 2 St. Klampen an den 3 Anlegedalben geplant (siehe Plan 75-111-03). Diese Planung resultierte aus einer Abstimmung des Planers mit dem Betriebsleiter der Fa. Adler Schiffe, Herrn Momke Marcussen.  
Die Montage begann im November 2020.

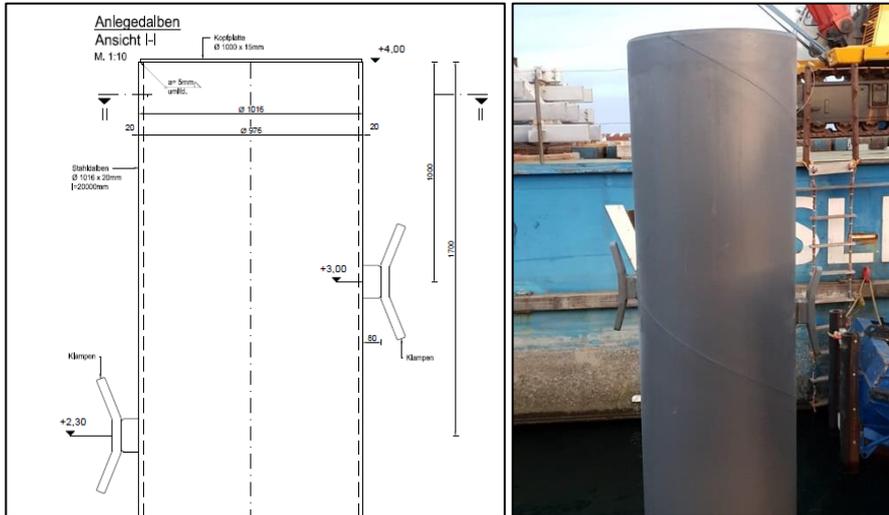


Abbildung 1: Auszug 75-111-03 Klampen geplant, Foto 2 St. Klampen montiert



Abbildung 2: gelieferte Klampen

Mit Beginn der Montage erfolgte eine Rückversicherung bei der Fa. Adler Schiffe zu den Höhen.  
Durch den neuen Betriebsleiter Herrn Stefan Müller wurden die Klampen als nicht nutzbar für ein festes Vertäuen bezeichnet. Es sind statt der Klampen Poller erforderlich.  
Die Arbeiten vor Ort wurden am 16.11.2020 durch die Bauüberwachung umgehend gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 2 Klampen montiert. Alles 6 Klampen waren geliefert.

Es wurden 6 St. Poller geliefert und montiert.

Im LV enthalten ist unter Pos. 05.0011 die Montage der Klampen. Diese Position entfällt für die 4 St. nicht montierten Klampen. Die Lieferung ist eine zusätzliche Leistung.

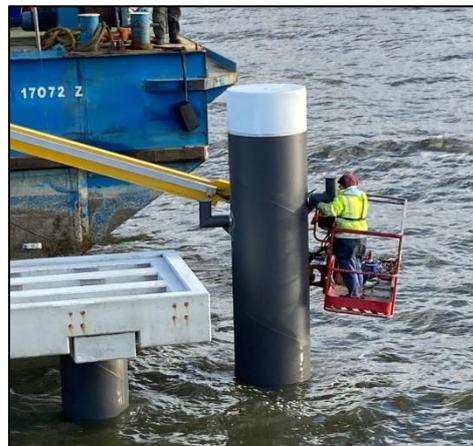
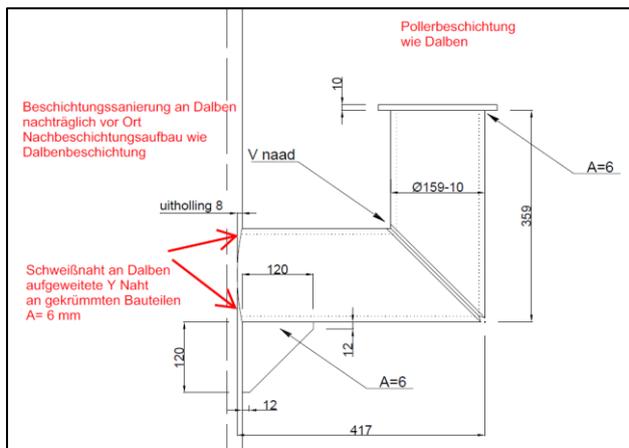


Abbildung 3: Werkstattplanung Poller, Foto: Pollermontage am Anlegerdalben

**3. Bewertung :**

3.1 Die Mengen des Nachtrages sind:

nachzuweisen                       richtig angesetzt                       zu niedrig

3.2 Dem Nachtragsangebot liegen bestätigte Einheitspreise zugrunde:

JA Pos. 55.0060                       NEIN restliche Positionen

3.3 Die Preise wurden geprüft und sind nachvollziehbar.

Sie  
 entsprechen dem Vertragsangebot                       sind als angemessen zu betrachten  
 sind tlw. zu hoch und sollten nachverhandelt werden

**4. Auswirkungen :**

4.1 Preise

Vom AN vorgelegte ungeprüfte Nachtragssumme:                      33.723,28 €, netto / ~~brutto~~.

Bewertete und geprüfte Nachtragssumme:                      31.891,48 €, netto / ~~brutto~~.

Die Gesamtauftragssumme erhöht sich um                      31.891,48 €, netto / ~~brutto~~.  
 Die Gesamtauftragssumme verringert sich um                      ..... netto / ~~brutto~~.

Die neue Gesamtauftragssumme einschl. aller bisher bearbeiteten / bestätigten Nachträge beträgt  
 .....siehe Aufstellung..... €, netto / ~~brutto~~.

4.2 Bauzeit

Der vorliegende Nachtrag hat keine Auswirkungen auf die Bauzeit und Vertragstermine.  
 Der vorliegende Nachtrag wirkt bauzeitverlängernd, ca. ...3-5.. Tage  
 Mit dem AN sind die Vertragstermine neu zu vereinbaren.

**5. Bestätigungsempfehlung :**

Es wird empfohlen, das Nachtragsangebot :

gemäß Bearbeitungsergebnis zu bestätigen  
 aus folgenden Gründen abzulehnen :  
 .....  
 mit dem Auftragnehmer eine Verhandlung mit folgendem Ziel zu führen :  
 Festlegung Terminverschiebung durch Änderung Klampen in Poller

Mit freundlichen Grüßen

Rostock, den 29.01.2021



i. A. Stefan Pentschew  
 SEA Control Engineering GmbH  
 i.A. b&o Ingenieure

Heuvelman Ibis GmbH · Großer Stein 18 · 26789 Leer

Gemeinde Koserow  
Eigenbetrieb Kurverwaltung über  
Amt Usedom Süd  
Markt 7  
17406 Usedom

## Angebot

Seebrücke Koserow

Datum : 19.11.2020 Seite : 1  
Angebots-Nummer: 2019-086e Na 6  
Bearbeiter:  
Durchwahl:  
E-Mail:

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
<b>55.0000</b>	<b>Nachtrag Nr. 6 - Poller für die Anlegedalben</b>				
55.0010	Poller bestehend aus Rohrwinkel Durchm. 159/10 mm Achslänge 330 mm horizontal und 280 mm vertikal einschl. 10 mm Kopfplatte liefern und einbauen.	6,000	Stck	1.502,03	9.012,18
55.0020	Ansatzpunkte für Pollerschweißung vorbereiten, Beschichtung entfernen und nach dem Schweißen wieder neu herstellen	6,000	Stck	382,18	2.293,08
55.0030	Zulage für die Herstellung der Belegklampen zu Pos.05.0011 Pollerklampen als Schweißkonstruktion aus Flachstählen gemäß Ausführungszeichnung Nr. 75-111-03 herstellen, strahlen grundbeschichten liefern und nachträglich anschweißen	2,000	Stck	1.272,49	2.544,98
55.0040	Zulage für die Herstellung der Belegklampen zu Pos.05.0011 Pollerklampen als Schweißkonstruktion aus Flachstählen gemäß Ausführungszeichnung Nr. 75-111-03 herstellen, strahlen grundbeschichten und liefern	4,000	Stck	317,02	1.268,08
55.0050	Belegklampen entfernen Bereits angeschweißte Belegklampen von den Anlegedalben abtrennen, Schweißgutreste entfernen, grundieren und vorort				
<b>Übertrag :</b>					<b>15.118,32</b>



**Angebot**  
Seebrücke Koserow

Nr. **2019-086e Na 6**

Die  
Spezialisten  
im  
Wasserbau

Datum : 19.11.2020 Seite : 2

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. €	Gesamt €
	<b>Übertrag</b>				<b>15.118,32</b>
	nachbeschichten, abgetrennte Klampen entsorgen				<b>1.910,94</b>
<u>Bedarfsposition</u>		<b>2,000</b>	<b>Stck</b>	<b>955,47</b>	<b>*** Nur E.P. ***</b>
55.0060	Nachlaß zu Pos. 05.0011 Belegklampen an Dalben anschweißen Schweißnaht > 8 mm Entfall der Schweißung der Belegklampen bestehend aus Rohr DA 150/10 im Werk	<b>4,00</b> <del>6,000</del>	<b>Stck</b>	<b>- 403,89</b> <b>-59,74</b>	<b>-1.615,56</b> <b>-358,44</b>
<b>55.0000</b>	<b>Nachtrag Nr. 6 - Poller für die Anlegedalben</b>				<b>-14.759,88</b>
	<b>Angebotssumme netto:</b>				<b>15.413,70</b> <b>-14.759,88 €</b>
	<b>MwSt. 19%:</b>			<b>2.928,60</b>	<b>-2.804,38 €</b>
	<b>Angebotssumme brutto:</b>			<b>18.342,30</b>	<b>17.564,26 €</b>

Wir hoffen Ihnen hiermit ein wirtschaftliches Angebot unterbreitet zu haben.

Für Fragen zum Angebot können Sie uns unter der Tel. 0491 / 976 70 21 erreichen.

Leer, den .....

.....

Sachlich u. rechnerisch geprüft.  
Zur Anweisung freigegeben:  
Hamburg, den **29.10.2021** €  
Name: **i. AS**  
b&o Ingenieure, Friedensallee 23  
22765 Hamburg, Tel.: 040 39919170  
**Stefan Pentschew**
